



Projekt Grundschule an der Wümme  
Neubau einer Grundschule

Auftrags-Nr. HH0572


Baustellenanschrift Schülerweg 3  
27389 Lauenbrück

Bauherr Samtgemeinde Fintel  
Projektleitung Sylvia Krohn  
Tel.: 040 713761 322  
[sylvia.krohn@goldbeck.de](mailto:sylvia.krohn@goldbeck.de)

Bauleitung Carsten Steffens  
Tel.: 0172 5860752  
[carsten.steffens@goldbeck.de](mailto:carsten.steffens@goldbeck.de)

# Progress Report

## Position Aufnahmen

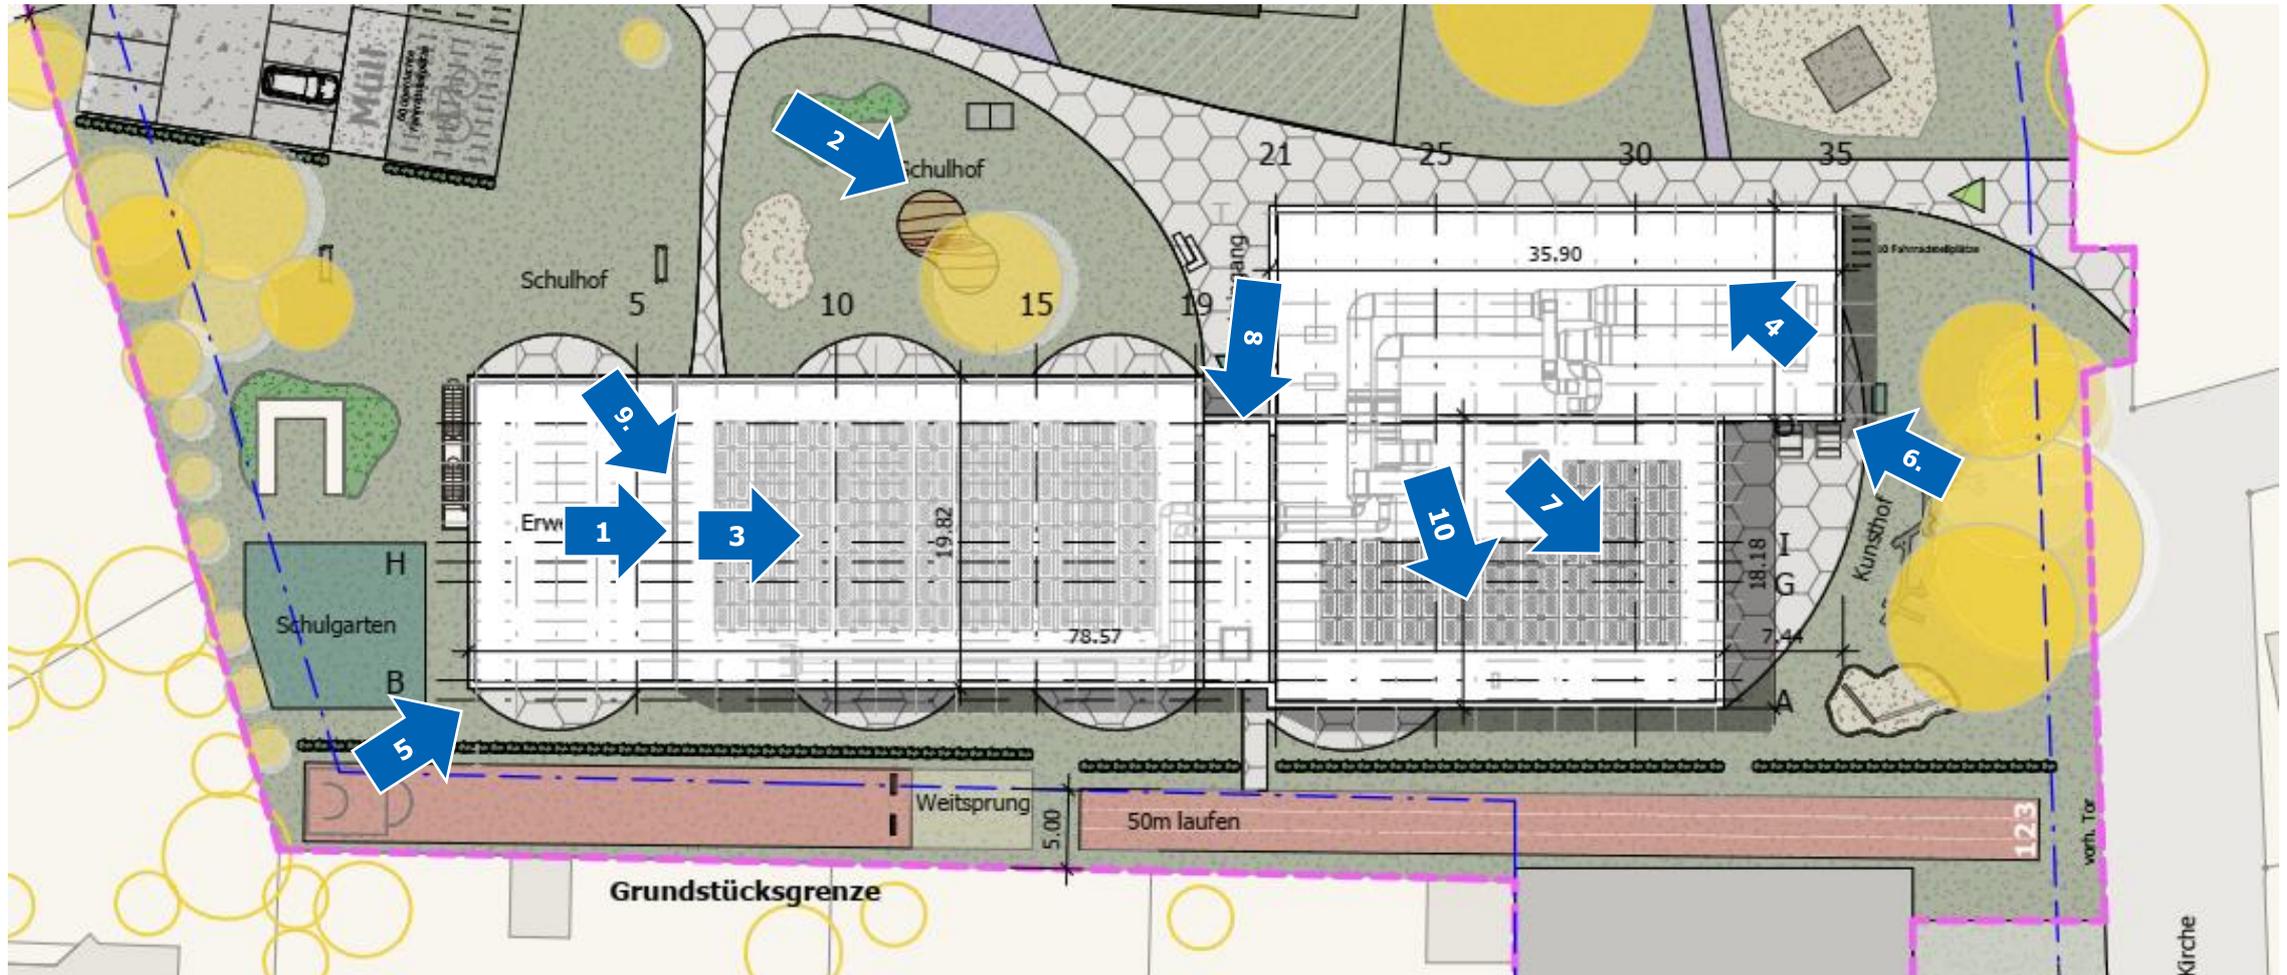

# Progress Report

## 01: OG: Deckenendinstallation Elektro und Lüftung Achse 1-19

Foto Nr. 1



Progress Report Nr. 17




# Progress Report

## 2: Übersicht: Fassadengerüst demontiert

Foto Nr. 2



Progress Report Nr. 17

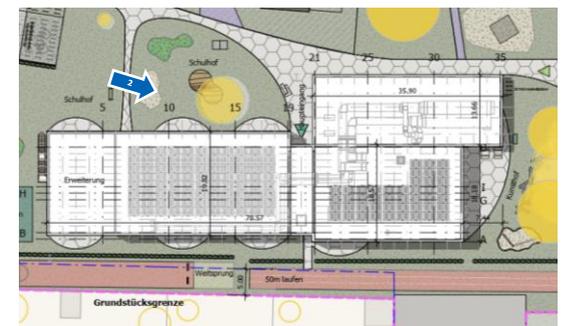

# Progress Report

## 3: EG: Bodenbelagsarbeiten Achse 1-19

Foto Nr. 3



Progress Report Nr. 17




# Progress Report

## 4: Pausenhalle: Deckenabhängiger montiert, Spachtelarbeiten



Progress Report Nr. 17

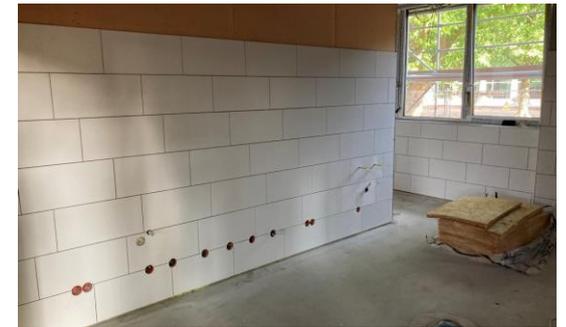


# Progress Report

## 5: Außenanlagen, Setzen Rinnen und Pflasterarbeiten



Progress Report Nr. 17

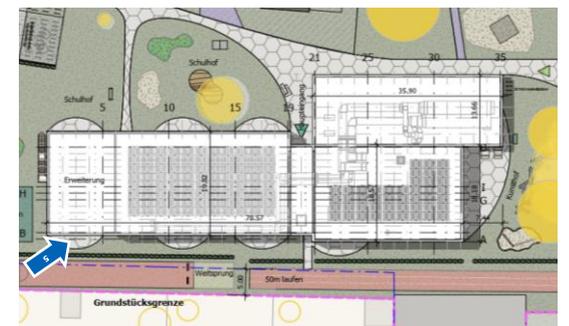


# Progress Report

## 6: Dach: Anbindearbeiten an RLT-Gerät und Luftwärmepumpe



Progress Report Nr. 17

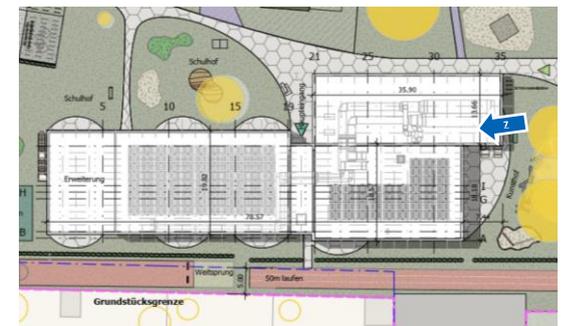


# Progress Report

## 7: TGA-Rasterausschnitte gesamtes OG eingelegt

Foto Nr. 7



Progress Report Nr. 17

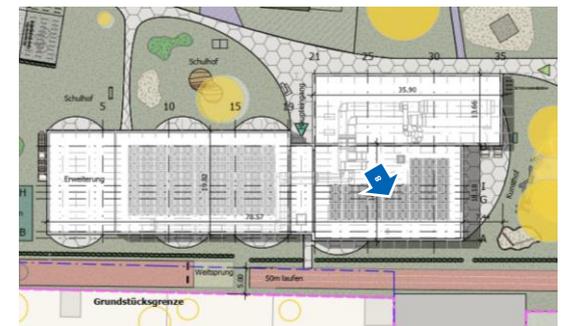


# Progress Report

## 8: TRH 2: Gerüst demontiert, Fliesenarbeiten, Promatarbeiten

Foto Nr. 8



Progress Report Nr. 17

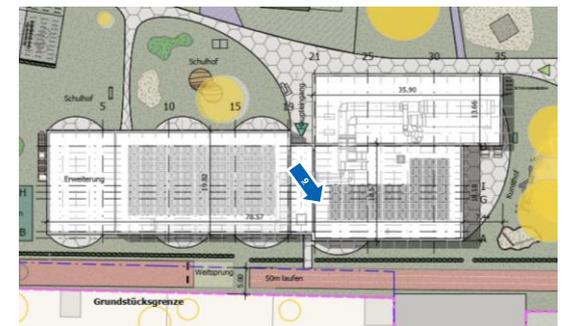


# Progress Report

## 8.1: TRH 2: Gerüst demontiert, Decken eingebaut

Foto Nr. 8



Progress Report Nr. 17

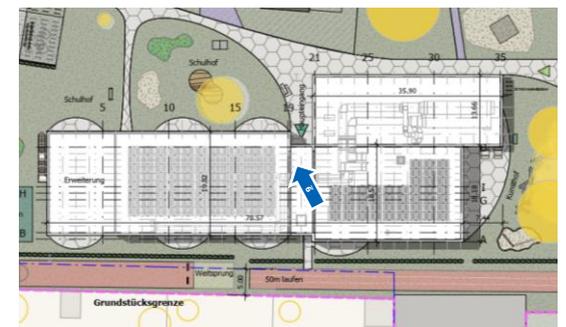

# Progress Report

## 9: Dach: Dachkanal-, Splitgeräte- und Trassenmontage



Progress Report Nr. 17



# Progress Report

## 10: Heizungsmontage, Vorleistung Hausanschluss hergestellt




Progress Report Nr. 17




# Progress Report

## 11: NSHV: Anschlussarbeiten GHV und UV

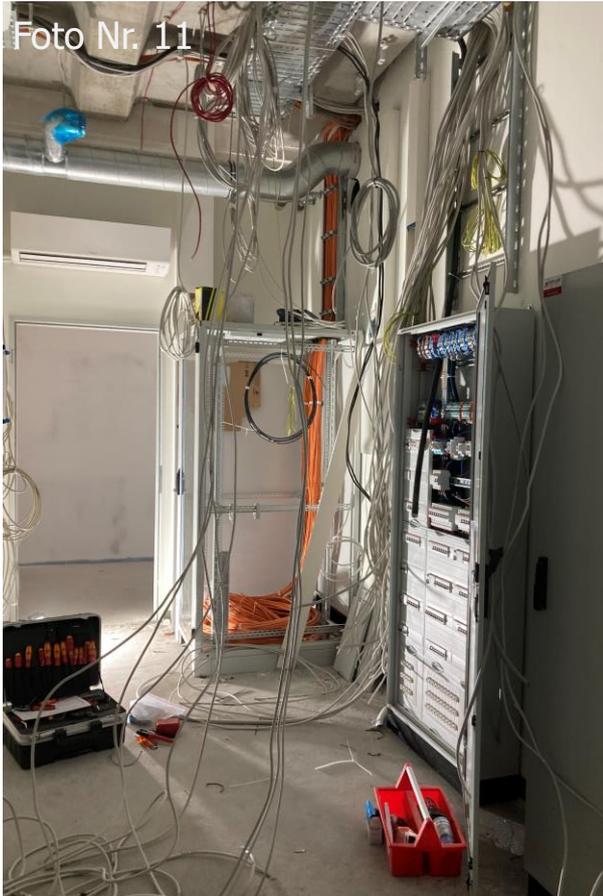

## Progress Report Nr. 17

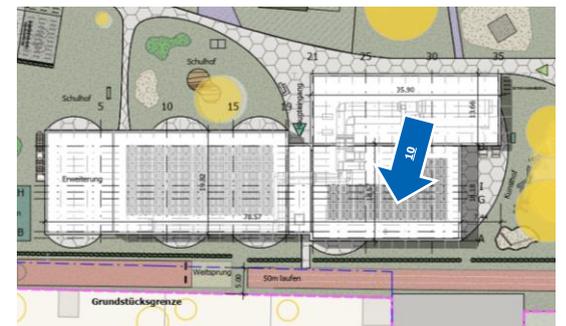

# Progress Report


## 12: WC's: Fliesenarbeiten vor Fertigstellung

---

Foto Nr. 11



Progress Report Nr. 17

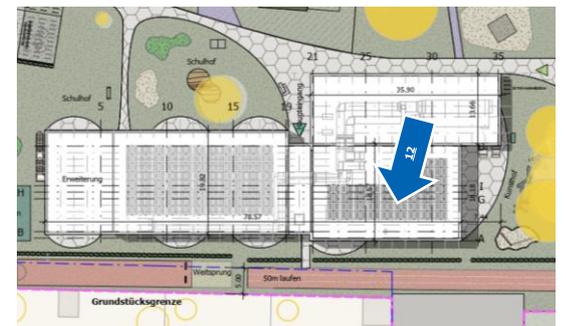

# Status Quo

---

## Laufende Gewerke KW 23

### Leistung

- Außenanlagen, Rinnen- und Pflastereinfassung
- TRH 2: Gerüst demontiert, Fliesenarbeiten
- Heizungsanbindung RLT-Gerät auf Pausenhalle
- Rohinstallation Lüftung Dach
- BMA Montagearbeiten Decke
- Decken Rastervervollständigung Flure OG, TGA-Auschnitte eingelegt
- Endmontage Lüftungsauslässe
- Attikablechmontage Pausenhalle, Vorbereitung Seilsystem
- Abschluss Zargenlackierung
- Schleifarbeiten Pausenhalle
- Bodenbelagsarbeiten EG 1-19
- Endmontage Steckdosen, Netzwerkdosen etc. im OG
- Fliesenarbeiten TRH 2, Fertigstellung Fliesenarbeiten WC's
- Heizungsmontage im HAR
- Kabelanschluss GLT und HV in NSH
- Deckeneinbau EG Achse 21-32 fertiggestellt
- Deckenrastereinbau in Pausenhalle

# Ausblick

---

## Ausblick in KW 24

### Leistung

- Bodenbelagsarbeiten EG 1-19 fertigstellen, Vorbereitung OG 21-32
- Abschluss Fliesenarbeiten TRH
- Abschluss Fliesenarbeiten Pausenhalle
- Drallauslassmontage fertigstellen im Hauptgebäude
- Deckeneinbau Pausenhalle
- Lampenendmontage gesamtes Gebäude inkl. Außenleuchten
- Promatierungsarbeiten TRH
- Attikaabdeckbleche + Montage Seilsystem Pausenhalle
- Restleistung Dachabdichtung fertigstellen
- Pflasterarbeiten Außenbereich, Rinnen setzen
- Beginn Parkplatzeinfassung, Fertigstellung Kanalreparaturen
- Montagearbeiten HAR
- Montagearbeiten NSHV und UV
- SV-Vorbegehung TGA
- Kabelzugarbeiten Dach
