



Projekt

Grundschule an der Wümme
Neubau einer Grundschule

Auftrags-Nr.

HH0572

Baustellenanschrift

Schülerweg 3
27389 Lauenbrück

Bauherr

Samtgemeinde Fintel

Projektleitung


Sylvia Krohn
Tel.: 040 713761 322
sylvia.krohn@goldbeck.de

Bauleitung

Carsten Steffens
Tel.: 0172 5860752
carsten.steffens@goldbeck.de

Progress Report

Position Aufnahmen

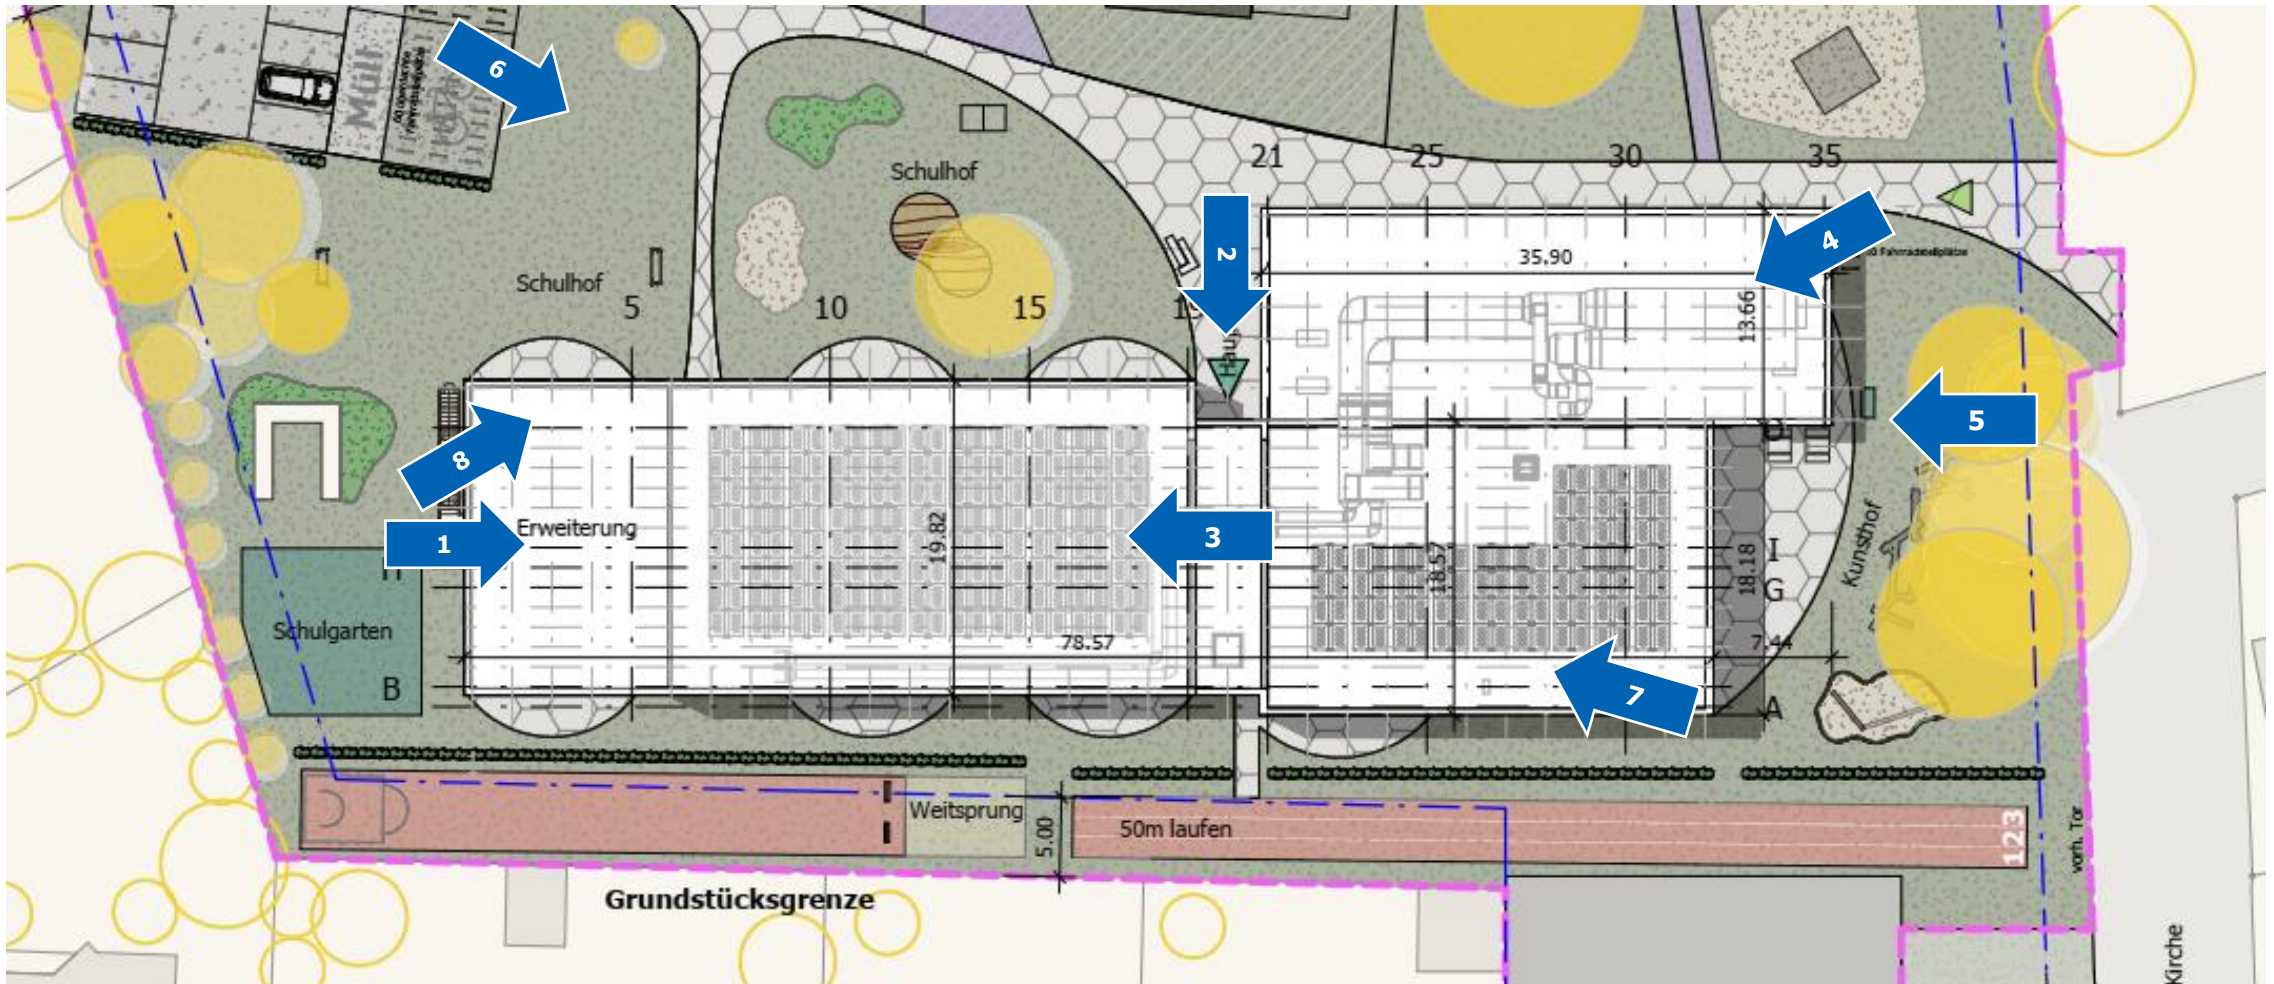


Progress Report

EG: ELT-Kabelzug abgeschlossen, Wände einseitig beplankt und gespachtelt

Foto Nr. 1



Progress Report Nr. 02

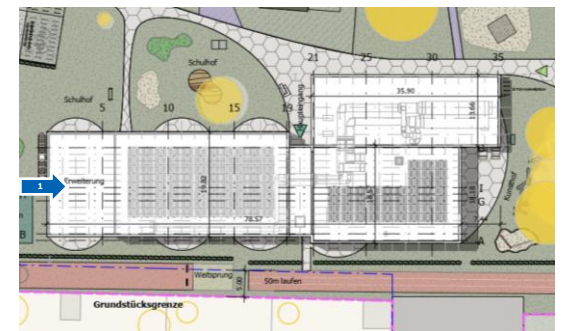


Progress Report

Montage Glas an PR-Fassade

Foto Nr. 2



Progress Report Nr. 02

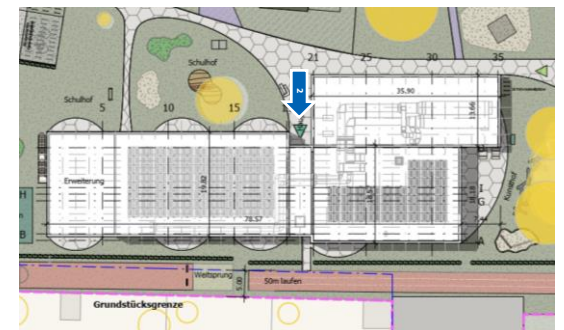


Progress Report

1.OG: Trockenbauwände beidseitig beplankt und gespachtelt

Foto Nr. 3



Progress Report Nr. 02

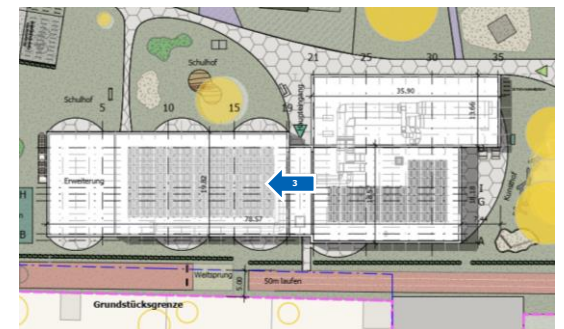


Progress Report

Tür- und Glaseinbau Pfostenriegelfassaden

Foto Nr. 4



Progress Report Nr. 02

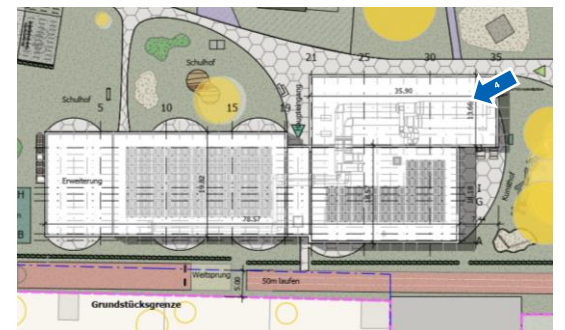


Progress Report

Montage Außentüren und Lochbleche

Foto Nr. 5



Progress Report Nr. 02

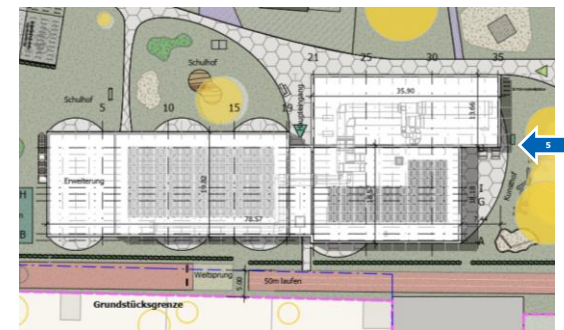

Progress Report

Übersicht

Foto Nr. 6



Progress Report Nr. 02


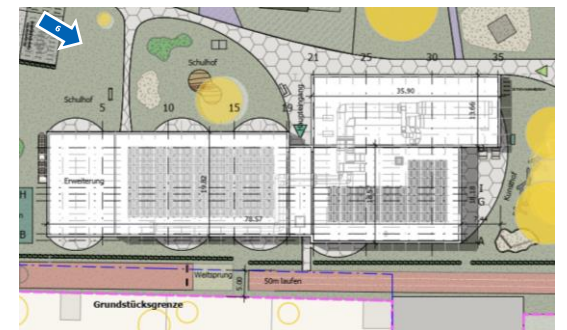


Foto Nr. 7

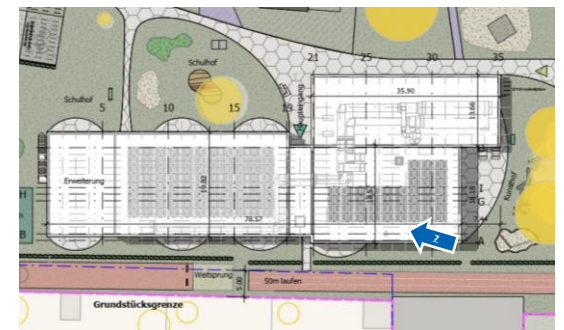


Progress Report

1.OG: Montage Lochbleche und Lüftungskanäle

Foto Nr. 8



Progress Report Nr. 03

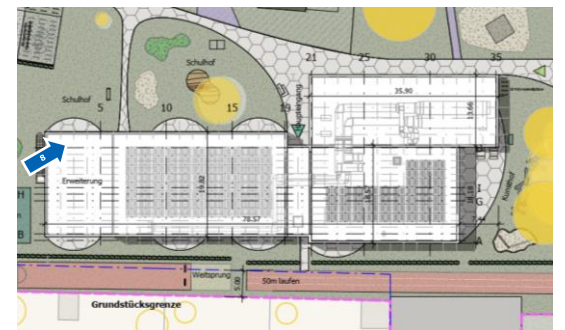

Status Quo

Laufende Gewerke	
Leistung	
• Anschweißen Dampfsperre auf Pausenhalle • Einbau Glas an PR-Fassaden • Schließen und Spachteln der Wände OG Achse 1-19 • Rohinstallation Heizung/ Sanitär Achse 1-19 • Elektroinstallationen EG Achse 1-19 • Vorbereitung Sockelabdichtung • Abschluss Montage Brandschutzfenster	

Ausblick

Start neuer/ Fortsetzung Gewerke in KW 07	
Leistung	
• Wände schließen EG Achse 1-19 • ELT-Kabelzug OG Achse 20-32 • Sockelabdichtung Hauptgebäude • Dachdurchführungen TGA • Rohinstallation Heizung Sanitär • Vorbereitungen Estrich OG Achse 1-19 • Beginn Klinkerarbeiten • Estrich- und Fußbodenheizungseinbau OG Achse 1-19 • Dampfsperre Pausenhalle	
