

Instandsetzung Bw 01 Brücke Riepe

Sachstand zum Rückbau der Kappen



WKC Hamburg GmbH
Planungen im Bauwesen

Veritaskai 8

21079 Hamburg


www.wk-consult.com

25.10.2023



Auszüge aus dem Bestandsplan

Querschnitt / Ansicht Mitteljoch M. 1:50

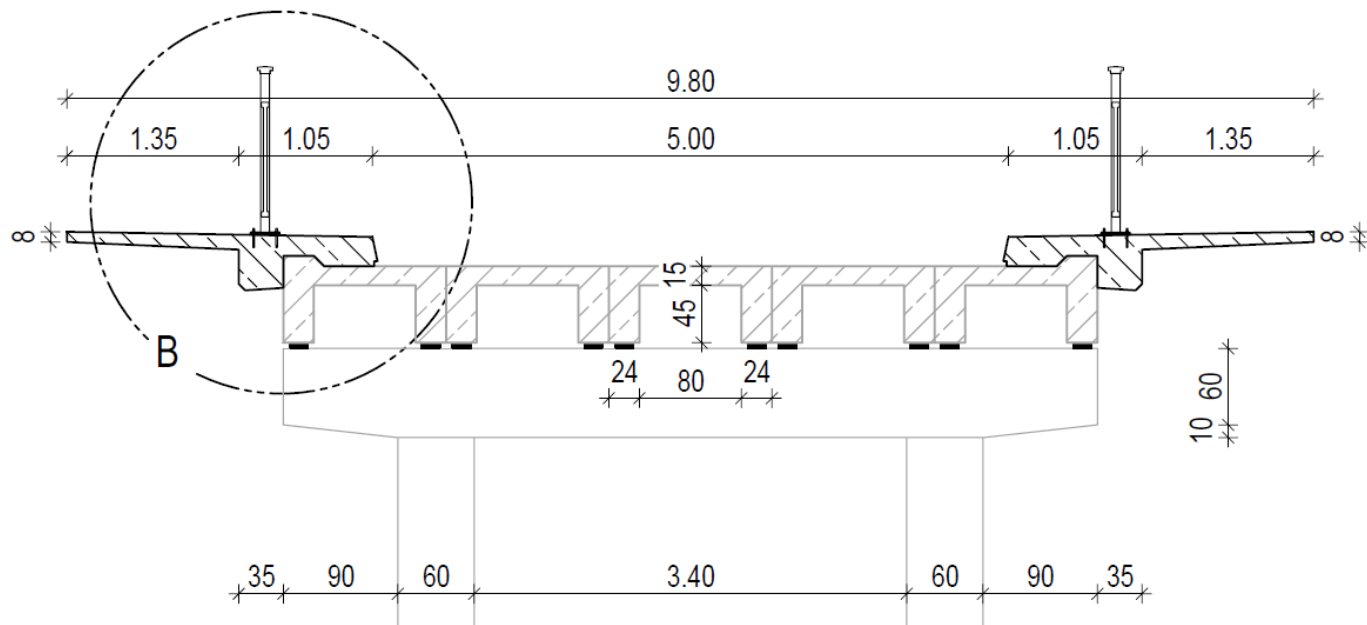

Sachstand:

- | | |
|------------|---|
| 14.03.2024 | Sitzung Bauausschuss mit Vorstellung des Sachstandes (Ergebnisse der objektspezifischen Schadensanalyse, Schlussfolgerungen für die Instandsetzung, Abstimmung zur Vergleichsbetrachtung einer Instandsetzung mit einem Ersatzneubau, Priorisierung der Sicherung der Kappen) |
| 22.04.2024 | Abstimmungsgespräch mit der Deutschen Bahn zur Vorstellung der Situation am Bauwerk und zur Abstimmung möglicher Sperrpausenzeiten
-> Zur Herstellung der Verkehrssicherheit soll vorerst nur der Rückbau der Kappen erfolgen |
| 13.05.2024 | Sonderprüfung der Kappen zur Feststellung der aktuellen Schäden
-> Grundsätzlich kann ein plötzliches Herabfallen nicht ausgeschlossen werden
-> Aktuell jedoch keine bedeutsamen Gefahrstellen erkennbar |
| 26.06.2024 | Anmeldung der Sperrpausen bei der Deutschen Bahn durch die ID Ing.-Gesellschaft Dannenberg mbH |


Sachstand:

16.08.2024 Übergabe der Entwurfsunterlage zum Rückbau der Brückenkappen


Auszüge aus der Entwurfsplanung zum Rückbau der Kappen



Auszüge aus der Entwurfsplanung zum Rückbau der Kappen

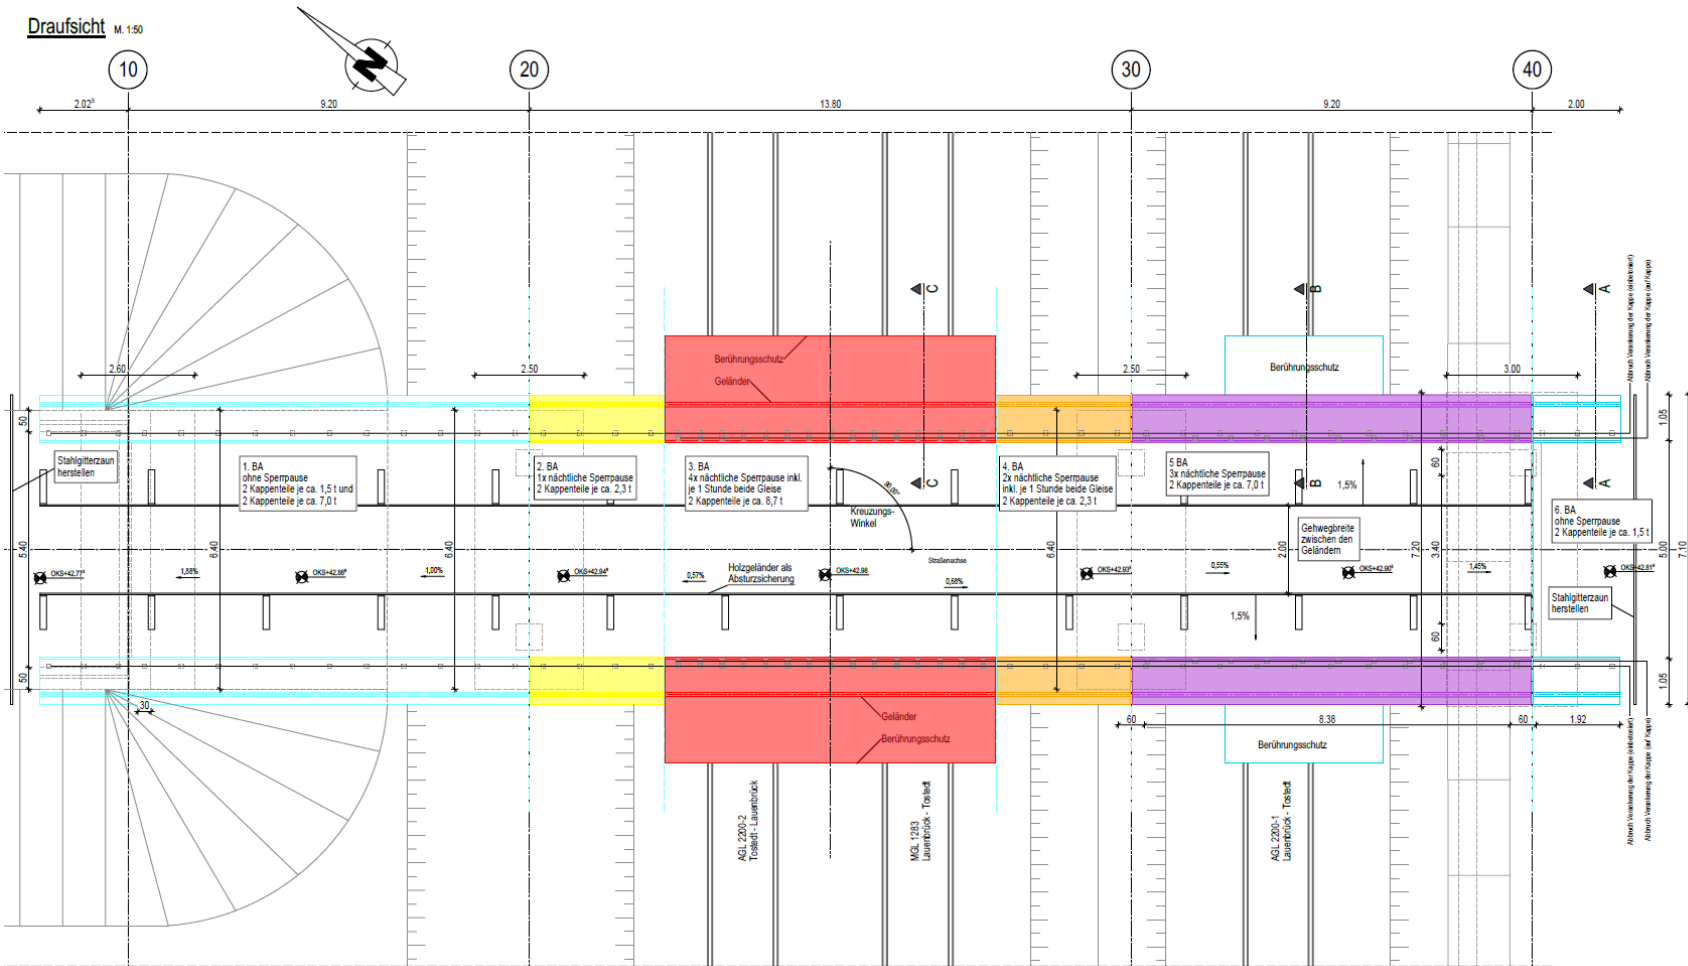

Auszüge aus der Entwurfsplanung zum Rückbau der Kappen

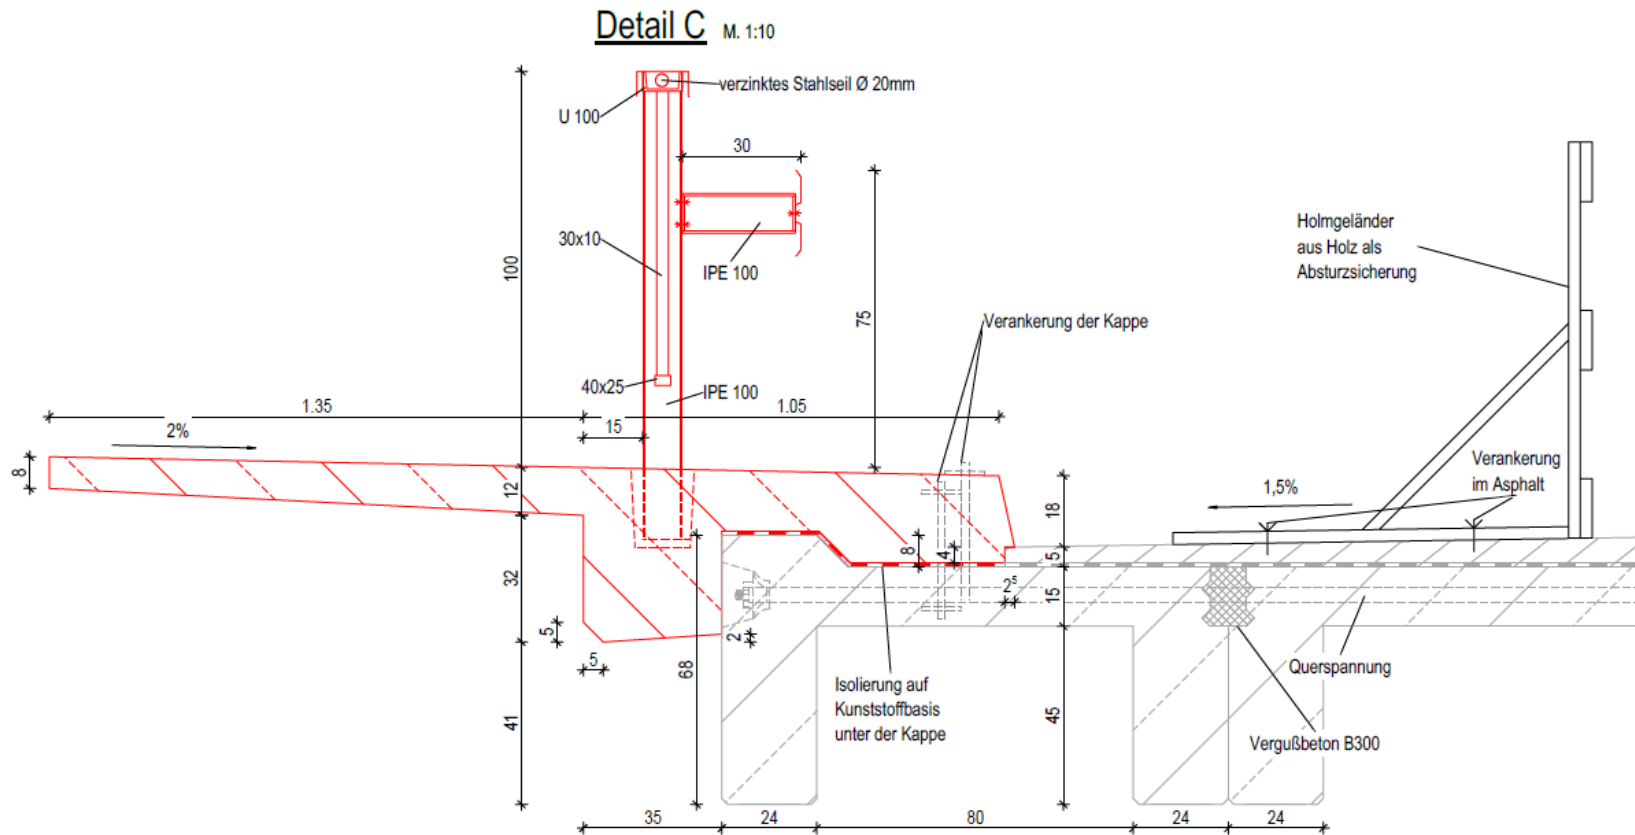

Sachstand / Ausblick:

16.08.2024	Übergabe der Entwurfsunterlage zum Rückbau der Brückenkappen
29.08.2024	Materialtechnische Untersuchungen am Bauwerk (Entsorgung Kappenbeton, Untersuchung Abdichtung und Fugenmaterial)
09/2024	Übergabe Vergleich zwischen Ersatzneubau und Instandsetzung anhand von Vergleichsprojekten
10/2024	Ausschreibung der Bauleistungen für den Rückbau der Kappen
12/2024	Vergabe der Bauleistungen für den Rückbau der Kappen
02/2025	Durchführung des Rückbaus der Kappen während der Sperrpausen der Deutschen Bahn
Ab 02/2028	Rückbau / Instandsetzung / Ersatzneubau des Brückenbauwerkes während der Vollsperrung der Deutschen Bahn zur Grundsanierung der Strecke Hamburg-Bremen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



WKC Hamburg GmbH
Planungen im Bauwesen

Veritaskai 8

21079 Hamburg

www.wk-consult.com

25.10.2023
